

SPRINT REVIEW 2

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO	2025-028	FECHA	15/11/2025
----------	--------------	--------	----------	-------	------------

INTRODUCCIÓN

En esta reunión de revisión del sprint, se busca hacer una revisión de los avances del proyecto, localizando lo que se ha hecho bien y mal durante la ejecución del sprint para tenerlo en cuenta en futuros sprints y proyectos.

El inicio de este segundo Sprint se marcaba en el día 10 de noviembre, con finalización en el 16 de noviembre, teniendo una duración de 7 días. Los implicados en la realización de las tareas son:

- Ángel Amo Sánchez
- Cristina Fernández Chica
- Marta Aguilar Morcillo
- Candela Jazmín Gutierrez González
- Iván Miranda Balastegui

OBJETIVOS

Para este segundo Sprint se planteaba tener una versión prácticamente finalizada del sistema web pedido, a falta de pruebas internas del código para la detección de fallos no detectables a simple vista. Se pretendía tener todas las funcionalidades pedidas implementadas de la forma más correcta posible, y con el diseño final, a falta de detalles por confirmar, de la página web.

Para este Sprint teníamos planeadas 20 tareas, repartidas de forma igualitaria entre todos los miembros del grupo.

TRABAJO COMPLETADO

ID	TAREA	ESTADO
T14	Implementar proceso de compra y pago - Backend	✓ Finalizada
T15	Implementar proceso de compra y pago - Frontend	✓ Finalizada
T16	Implementar seguimiento de pedidos - Backend	✓ Finalizada
T17	Implementar seguimiento de pedidos - Frontend	✓ Finalizada
T22	Implementar la gestión de pedidos - Backend	✓ Finalizada
T23	Implementar la gestión de pedidos - Frontend	✓ Finalizada
T24	Implementar la gestión de ventas - Backend	✓ Finalizada
T25	Implementar la gestión de ventas - Frontend	✓ Finalizada
T34	Sprint Backlog 2	✓ Finalizada
T37	Sprint Review 2	✓ Finalizada

T40	Sprint Retrospective 2	✓ Finalizada
T43	Informe de desempeño del equipo de trabajo 2	✓ Finalizada
T46	Informe de seguimiento de costes 2	✓ Finalizada
T49	Informe de seguimiento del cronograma 2	✓ Finalizada
T51	Informe registro de cambios 2	✓ Finalizada
T53	Informe registro de incidencias 2	✓ Finalizada
T55	Desarrollar Componentes Visuales Reutilizables	✓ Finalizada
T56	Maquetar las Vistas Principales (inicio, catálogo, cesta, etc.)	✓ Finalizada
T57	Implementar Interacción y Validaciones en el Cliente 1	✓ Finalizada
T61	Elaborar registro de decisiones 2	✓ Finalizada

La tarea “Implementar Interacción y Validaciones en el Cliente 1” está dividida en dos por planificación en el cronograma, pero se ha decidido completarla en esta segunda iteración. Por tanto, la tarea con ID T58 y nombre “Implementar Interacción y Validaciones en el Cliente 2”, también ha sido completada.


Como se puede observar, ninguna tarea de las planificadas quedó pendiente de realización, todas fueron completadas.

FEEDBACK

Las implementaciones realizadas durante este Sprint han sido validadas únicamente por el equipo director del proyecto, pues el equipo de trabajo aún no se ha podido reunir con el patrocinador para mostrarle la aplicación web. Esto aplica a lo realizado durante la primera iteración, donde solo hubo revisión de documentación entregada, por lo que las funcionalidades quedan pendientes de revisión durante esta semana.

MÉTRICAS DEL SPRINT

Sprint Burndown

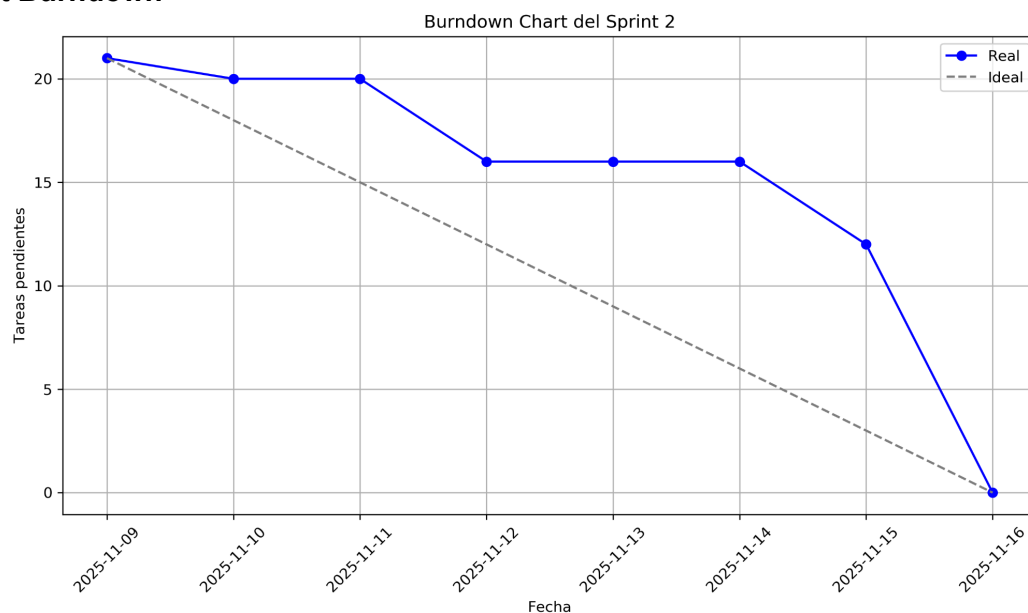

Si observamos el gráfico burndown de las tareas completadas en este Sprint, vemos que se produce un cuello de botella en los días entre el 13 y 15 debido al fallo en el orden de planificación de las tareas T55 y T56. Estas dos deberían de haberse planificado para después de todas las tareas de implementación de funcionalidades, y las de funcionalidades adelantarse en su realización.

Esto se puede comentar como un fallo del equipo, que no ha sabido replanificar en el momento por falta de disponibilidad de los componentes del equipo.

A pesar de esto, todas las tareas han sido completadas en tiempo, solucionando los errores encontrados en el camino.

PRÓXIMOS PASOS

Para el siguiente Sprint el equipo planea realizar una revisión completa de las funcionalidades implementadas, realizando la revisión final a través de la implementación de tests de código.
