

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - ITERACIÓN 1

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO	2025-028	FECHA	09/11/2025
----------	--------------	--------	----------	-------	------------



**TRACTOR
AMARILLO**
ONLINE STORE

ÍNDICE

Resumen ejecutivo.....	3
Seguimiento general del cronograma.....	4
Análisis del seguimiento general del cronograma.....	5
Seguimiento general de costes.....	6
Análisis del seguimiento general de costes.....	7
Estado de las tareas a entregar.....	8
Sprint Burndown.....	9
Seguimiento de riesgos e incidencias.....	10
Solicitudes de cambio.....	10

Resumen ejecutivo

En esta primera iteración, se ha realizado una versión inicial de la aplicación web, con las funcionalidades más básicas y un primer diseño no definitivo.

Se han completado todas las tareas previstas para la iteración. Algunas han sufrido retrasos, pero esto no ha afectado al desarrollo normal del resto de actividades.

No se han generado solicitudes de cambio, pero si se han producido incidencias debido a esos retrasos, que aunque finalmente no han afectado al desarrollo, se han tenido en cuenta.

Seguimiento general del cronograma

ACTIVIDAD	COMIENZO PLANIFICADO	COMIENZO REAL	FIN PLANIFICADO	FIN REAL	% COMPLETADO	HORAS PLANIFICADAS	HORAS REALES	VARIACIÓN (horas)
Elaborar documentación de seguimiento y control: Sprint Backlog 1	03/11/2025	30/10/2025	05/11/2025	30/10/2025	100%	2	2	0
Configurar entorno de trabajo	30/10/2025	02/11/2025	30/10/2025	02/11/2025	100%	2	2	0
Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	100%	3	2,5	-0,5
Realizar formación en Django	30/10/2025	30/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	100%	40	40	0
Implementar ficha de producto	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	100%	3	2,5	-0,5
Implementar lógica de buscador y filtros	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	100%	5	2,2	-2,8
Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	04/11/2025	03/11/2025	04/11/2025	03/11/2025	100%	5	2,2	-2,8
Implementar gestión de productos	07/11/2025	06/11/2025	08/11/2025	06/11/2025	100%	7	2	-5
Implementar Gestión de la cesta de compra	06/11/2025	07/11/2025	10/11/2025	08/11/2025	100%	30	12	-18
Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	05/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	100%	4	7	+3

Generar Informe de Seguimiento de Costes (MS Project)	08/11/2025	09/11/2025	08/11/2025	NOD	33%	2	3	+1
Diseño de mockups de interfaz	01/11/2025	03/11/2025	02/11/2025	09/11/2025	100%	8	13	+5
Definir la estructura de la interfaz	03/11/2025	03/11/2025	04/11/2025	09/11/2025	100%	8	5	-3
Implementar gestión de clientes	08/11/2025	07/11/2025	09/11/2025	07/11/2025	100%	7	1	+6
Generar Informe de Seguimiento del Cronograma (MS Project)	08/11/2025	09/11/2025	08/11/2025	NOD	33%	2	4	+2
Elaborar el Registro de Decisiones	07/11/2025	03/11/2025	07/11/2025	NOD	29%	15	4.29	-----
Sprint Review 1	09/11/2025	08/11/2025	09/11/2025	08/11/2025	100%	2	2	0
Sprint Retrospective 1	09/11/2025	08/11/2025	09/11/2025	08/11/2025	100%	2	2	0
								-15,6

Análisis del seguimiento general del cronograma

Observamos que el balance de horas finalmente invertidas en la iteración, nos sale negativo (-15,6 horas). Esto quiere decir que hemos planificado más horas de las que realmente hemos terminado invirtiendo en las tareas realizadas dentro de esta iteración, lo que nos deja ver que hemos realizado una planificación pesimista. Además, se pueden observar algunos errores en la planificación, pues hay tareas que en el momento de realizar la planificación, no conocíamos su naturaleza cíclica. Estas son todas aquellas marcadas con “NOD” en el campo “FIN REAL”. Al inicio de la próxima iteración se generará una petición de cambio para solucionar este problema.

Además, si nos remitimos al archivo “Informe de seguimiento del cronograma - Iteración 1.pdf”, existe un retraso con respecto al cronograma (SPI y SV Total) que señalan este fallo y pesimismo en la planificación, pues ese retraso viene dado principalmente por las tareas que no han sido considerada cíclicas y que, sin embargo, lo son.

Seguimiento general de costes

ACTIVIDAD	COSTE PRESUPUESTADO	COSTE REAL	VARIACIÓN (€)	CAUSA DEL DESVÍO
Elaborar documentación de seguimiento y control: Sprint Backlog 1	60€	60€	0€	No procede
Configurar entorno de trabajo	60€	60€	0€	No procede
Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	90€	75€	-15€	Finalmente, se necesitó menos tiempo para el desarrollo del diagrama
Realizar formación en Django	1600€	1600€	0€	No procede
Implementar ficha de producto	90€	75€	-15€	Se necesitó menos tiempo
Implementar lógica de buscador y filtros	150€	66€	-84€	Estimación de tiempo demasiado pesimista
Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	150€	66€	-84€	Estimación de tiempo demasiado pesimista
Implementar gestión de productos	210€	60€	-150€	Estimación demasiado pesimista por desconocimiento de la tecnología
Implementar Gestión de la cesta de compra	900€	360€	-540€	Estimación demasiado pesimista por desconocimiento de la tecnología

Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	120€	210€	+90€	Estimación demasiado optimista por desconocimiento de la tecnología
Generar Informe de Seguimiento de Costes (MS Project)	80€	26,4€ (por ahora)	-53.6€	Fallo en la planificación
Diseño de mockups de interfaz	240€	390€	+150€	Estimación demasiado optimista
Definir la estructura de la interfaz	240€	150€	-90€	Estimación demasiado pesimista
Implementar gestión de clientes	210€	30€	-180€	Estimación demasiado pesimista por desconocimiento de la tecnología
Generar Informe de Seguimiento del Cronograma (MS Project)	80€	26,4€ (por ahora)	-53.6€	Fallo en la planificación
Elaborar el Registro de Decisiones	120€	40€	-80€ (por ahora)	Fallo en la planificación
Sprint Review 1	60€	60€	0	No procede
Sprint Retrospective 1	80€	80€	0	No procede
			-1105.2€	

Análisis del seguimiento general de costes

Se observa que la variación de los costes estimados frente a los costes reales, nos sale negativa (-1105.2€). Esto se debe a una planificación de tareas demasiado pesimista en conjunto. Además, como se ha comentado en las correspondientes tareas, existen algunos fallos en la planificación, que como ya se ha mencionado, se realizarán las correspondientes solicitudes de cambios para dejar el fallo atrás.

De nuevo, si nos remitimos al archivo “Informe de seguimiento de costes - iteración 1.pdf”, existe un ahorro considerable entre los costes inicialmente planificados, y los costes reales. Esto se observa también en el CPI Global (1.18), donde nos encontramos con un rendimiento eficiente. Es decir que, a pesar de estos pequeños fallos cometidos, el coste del proyecto ha mejorado respecto a lo inicialmente planificado.


Estado de las tareas a entregar

TAREA	ESTADO	VALIDADO POR	OBSERVACIONES
Elaborar documentación de seguimiento y control: Sprint Backlog 1	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo
Configurar entorno de trabajo	FINALIZADA	Equipo de trabajo	Ha sufrido retrasos, se ha terminado dentro de la iteración
Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo
Realizar formación en Django	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo
Implementar ficha de producto	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo
Implementar lógica de buscador y filtros	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo
Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo
Implementar gestión de productos	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo
Implementar Gestión de la cesta de compra	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo
Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	FINALIZADA	Equipo de trabajo	Ha sufrido retrasos, se ha terminado dentro de la iteración
Generar Informe de Seguimiento de Costes (MS Project)	FINALIZADA	Equipo de trabajo	Fallo en la planificación, cambio necesario
Diseño de mockups de interfaz	FINALIZADA	Equipo de trabajo	Ha sufrido retrasos, se ha terminado dentro de la iteración
Definir la estructura de la interfaz	FINALIZADA	Equipo de trabajo	Ha sufrido retrasos, se ha terminado dentro de la iteración
Implementar gestión de clientes	FINALIZADA	Equipo de trabajo	Ha sufrido retrasos, se ha terminado dentro de la iteración
Generar Informe de Seguimiento del Cronograma (MS Project)	FINALIZADA	Equipo de trabajo	Fallo en la planificación, cambio necesario
Elaborar el Registro de Decisiones	FINALIZADA	Equipo de trabajo	Fallo en la planificación, cambio necesario
Sprint Review 1	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo

Sprint Retrospective 1	FINALIZADA	Equipo de trabajo	En tiempo
------------------------	------------	-------------------	-----------

Aquellas tareas que han sufrido retrasos, se completaron dentro de la iteración correspondiente y sin afectar al desarrollo normal del resto de actividades a realizar. Los fallos en la planificación del cronograma no han impedido la realización normal de las tareas señaladas con este inconveniente.

Sprint Burndown

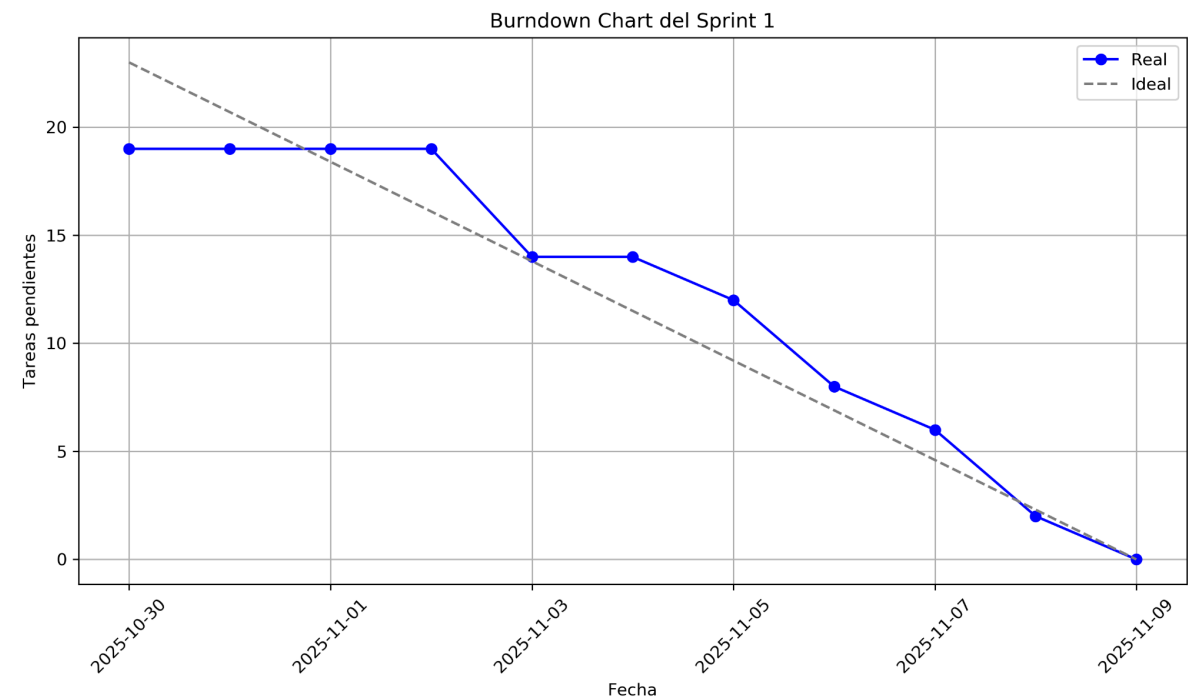

Si observamos el burndown de las tareas planificadas para esta iteración, vemos que la mayor parte del tiempo hemos ido bastante cerca a lo ideal, lo que concuerda con haber realizado todas las tareas a tiempo. Los mayores retrasos surgieron entre el 4 y el 5 de noviembre.

Seguimiento de riesgos e incidencias

ID INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ACCIÓN TOMADA	RIESGO(S) RELACIONADO
1	Retraso en la configuración del entorno de trabajo	Cerrada	Se utilizó la estructura montada durante la formación del equipo para evitar mayores retrasos y malas configuraciones	5 - Retrasos en el desarrollo por falta de experiencia previa del equipo en Django
2	Retraso en la realización de los mockups de la aplicación	Cerrada	Se ha decidido desarrollar el resto de tareas, teniendo todos los desarrolladores una idea general de la interfaz del sistema que ya se había comentado previamente.	8 - Bajo rendimiento del equipo debido a estimaciones de tiempo incorrectas en la planificación 9 - Bajo rendimiento del equipo debido a estimaciones de tiempo incorrectas en la planificación
3	Retraso en la implementación de la gestión de usuarios	Cerrada	Se decidió dar margen de un día ya que no se hizo bien la estimación de esta tarea por desconocimiento de las tecnologías.	5 - Retrasos en el desarrollo por falta de experiencia previa del equipo en Django 9 - Bajo rendimiento del equipo debido a estimaciones de tiempo incorrectas en la planificación
4	Fallo en la planificación de algunas tareas en el cronograma	Abierta	Se realizará una solicitud de cambio de la planificación del proyecto al inicio de la iteración 2	9 - Bajo rendimiento del equipo debido a estimaciones de tiempo incorrectas en la planificación

Todos los riesgos relacionados se han seguido de cerca, de esta manera se ha evitado el retraso en la finalización de todas las tareas planificadas para esta iteración.

Solicitudes de cambio

No procede, los cambios necesarios se propondrán al inicio de la iteración 2.
